


FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Presupuesto Participativo
Proyecto	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Tocachi

Descripción del proyecto	Las obras de infraestructura civiles y viales que se implementarán en la parroquia de Tocachi coadyuvarán a garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la conservación del ambiente. Considerando que en la parroquia se diagnostica que existen 579 viviendas, de los cuales el 75,2% disponen de documentos que acrediten la tenencia propia de la vivienda, con un déficit de servicios residenciales básicos del 92,2%. El promedio de personas que habitan en un cuarto es de 3.1. La parroquia presenta un índice de viviendas con hacinamiento del 33.6% y de viviendas sin hacinamiento del 66.4%. El barrio de menor cobertura de servicios de agua por red pública es Chimburlo con apenas el 42.4%, seguido de San Jose, con un 52.2% respectivamente, San Francisco con el 6.3%, San Juan-Rumitola-Santo Domingo con el 72%, Cochasquí 72.7%, El Centro con 81.3% y el barrio que mayor cobertura tiene es La Loma con el 88.6% El Barrio de menor cobertura de servicio de alcantarillado es Chimburlo que alcanza al 1.7%, Tanda-Moronga 2.7% Cochasquí con el 9.1%, San Juan- Santo Domingo- Rumitola el 12%, Sanjapunta 21.4%, San José 30.4%, San Francisco 43.3% y La Loma con el 68.6% que es la más alta cobertura La parroquia de Tocachi, dispone de un 11.14% de vías de tramos asfaltados, 13.93% de empedrado, lastrado un 9.47% y de tierra un 65.46%. Cabe señalar que en el interior de la parroquia las vías están	Objetivo: 1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de Tocachi a base del Presupuesto participativo. 2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de Tocachi en las comunidades de: San Juan, Chimburlo, Cochasquí, y la zona central de Tocachi.
---------------------------------	--	--

Seguimiento				Ejecución				
Para avance programático				Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
Detalle	Medio de verificación	Pond. %						
1	Gestión de 8 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Tocachi	POA y PAC 2018	30,00	Porcentaje	100	25	x	30/04/2018
2	Baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	-	Porcentaje	100	0	0	31/07/2018
3	Contratación de la obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	-	Porcentaje	100	0	0	31/07/2018
4	Adquisición de materiales para la construcción de la obra de mejoramiento extensión agua potable (Tocachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	20	x	31/11/2018
5	Contratación de los estudios Sistema de alcantarillado pluvial de la cabecera parroquial de la parroquia de Tocachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	-	Porcentaje	100	0	0	31/07/2018
6	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de dos vías transversales del Barrio San Juan (0,45Km)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	20	x	30/11/2018
7	Contratación de la obra de construcción de alcantarillado sanitario de la calle Pichincha - Chimburlo de la parroquia de Tocachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	65	x	31/10/2018
8	Contratación de la obra de construcción de la obra de alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	x	31/10/2018
9	Adquisición de materiales para la construcción del embaulado de la calle García Moreno	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	x	30/11/2018
10	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	10,00	Porcentaje	100	0	x	31/07/2018
11	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	10,00	Unidad	13	8	x	30/09/2018
100,00								
Avance financiero				Codificado				
				Inicial		Reforma		Ejecutado
GAD MPM				\$		320.438,85		-

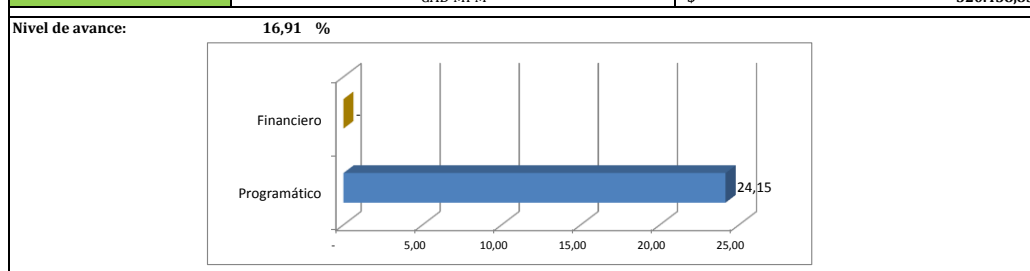

Mes	Programático	Financiero
Enero	0,38	-
Febrero	2,63	-
Marzo	5,05	-
Abril	24,15	-
Mayo	8,04	-
Junio	10,54	-
Julio	11,18	-
Agosto	12,31	-
Septiembre	24,15	-
Octubre	22,15	-
Noviembre	24,15	-
Diciembre	24,15	-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<u>Avances:</u> Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil	31/01/2018
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se espera la tabla salarial que emita la constraloría general del estado.		
Febrero, 2018	<u>Avances:</u> Se realiza el proceso precontractual del Proyecto del alcantarillado de Chimburlo.	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil	28/02/2018
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica		
Marzo, 2018	<u>Avances:</u> Se sube el proceso precontractual del proyecto de la construcción de las Baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil	31/03/2018

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Abril, 2018	<u>Avances:</u> Se recibe los diseños de proyectos y presupuestos para sus respectivos análisis y definicion de los proyectos y TDR's para iniciar los procesos precontractuales.	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil	30/04/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Mayo, 2018	<u>Avances:</u> Se recibe los diseños de proyectos y presupuestos para sus respectivos análisis y definicion de los proyectos y TDR's para iniciar los procesos precontractuales de Alcanatrillado y Agua Potable de San Juan .	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil	30/05/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Junio, 2018	<u>Avances:</u> Se recibe los diseños de proyectos y presupuestos para sus respectivos análisis y definicion de los proyectos y TDR's para iniciar los procesos precontractuales de Alcanatrillado y Agua Potable de San Juan .	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil	30/06/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Julio, 2018	<u>Avances:</u> Contratación de la obra de construcción de la obra de alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I, se encuentra en EMASA para corrección de observaciones y presentación de propuesta para ejecución ya que el costo estimado para esta obra es de \$90000.00 y se cuenta únicamente con \$60000.00; los proyectos que se encuentran en "0", no se ejecutarán debido al pedido de liberación de fondos para la contraparte municipal al prestamo del BDE, para la cosntrucción de las nuevas plantas de tratamiento y el sistema de alcantarillado de Tomalón 1 y 2, y Chimbacalle.	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/07/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Los procesos precontractuales de Alcanatrillado y Agua Potable de San Juan se detienen debido a que se devolvió los documentos para correcciones a EP EMASA PM y no han sido remitidos nuevamente.		
Agosto, 2018	<u>Avances:</u> Contratación de la obra de construcción de la obra de alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I, se encuentra en EMASA para corrección de observaciones y presentación de propuesta para ejecución ya que el costo estimado para esta obra es de \$90000.00 y se cuenta únicamente con \$60000.00; los proyectos que se encuentran en "0", no se ejecutarán debido al pedido de liberación de fondos para la contraparte municipal al prestamo del BDE, para la cosntrucción de las nuevas plantas de tratamiento y el sistema de alcantarillado de Tomalón 1 y 2, y Chimbacalle.	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/08/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Los procesos precontractuales de Alcanatrillado y Agua Potable de San Juan se detienen debido a que se devolvió los documentos para correcciones a EP EMASA PM y no han sido remitidos nuevamente.		
Septiembre, 2018	<u>Avances:</u> Contratación de la obra de construcción de la obra de alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I, se encuentra en EMASA para corrección de observaciones y presentación de propuesta para ejecución ya que el costo estimado para esta obra es de \$90000.00 y se cuenta únicamente con \$60000.00; los proyectos que se encuentran en "0", no se ejecutarán debido al pedido de liberación de fondos para la contraparte municipal al prestamo del BDE, para la cosntrucción de las nuevas plantas de tratamiento en Tabacundo y el sistema de alcantarillado de Tomalón 1 y 2, y Chimbacalle.	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	30/09/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Los procesos precontractuales de Alcanatrillado y Agua Potable de San Juan se detienen debido a que se devolvió los documentos para correcciones a EP EMASA PM y no han sido remitidos nuevamente.		
Octubre, 2018	<u>Avances:</u> Contratación de la obra de construcción de la obra de alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I, no se ejecutará debido a que esos recursos se los utilizará para comprar materiales para el asfaltado de la vía Marianitas - La Alegría; los proyectos que se encuentran en "0", no se ejecutarán debido al pedido de liberación de fondos para la contraparte municipal al prestamo del BDE, para la cosntrucción de las nuevas plantas de tratamiento en Tabacundo y el sistema de alcantarillado de Tomalón 1 y 2, y Chimbacalle.	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/10/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Los procesos precontractuales de Alcanatrillado y Agua Potable de San Juan se detienen debido a que se devolvió los documentos para que la EP EMASA PM complete la documentación con los modelos de convenios.		
Noviembre, 2018	<u>Avances:</u> Contratación de la obra de construcción de la obra de alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I, no se ejecutará debido a que esos recursos se los utilizará para comprar materiales para el asfaltado de la vía Marianitas - La Alegría; los proyectos que se encuentran en "0", no se ejecutarán debido al pedido de liberación de fondos para la contraparte municipal al prestamo del BDE, para la cosntrucción de las nuevas plantas de tratamiento en Tabacundo y el sistema de alcantarillado de Tomalón 1 y 2, y Chimbacalle.	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	30/11/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Los procesos precontractuales de Alcanatrillado y Agua Potable de San Juan fueron enviados a compras públicas para el trámite correspondiente.		
Diciembre, 2018	<u>Avances:</u> Contratación de la obra de construcción de la obra de alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I, no se ejecutará debido a que esos recursos se los utilizará para comprar materiales para el asfaltado de la vía Marianitas - La Alegría; los proyectos que se encuentran en "0", no se ejecutarán debido al pedido de liberación de fondos para la contraparte municipal al prestamo del BDE, para la cosntrucción de las nuevas plantas de tratamiento en Tabacundo y el sistema de alcantarillado de Tomalón 1 y 2, y Chimbacalle.	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/12/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No se ha podido contratar aún la mayoría de los proyectos debido a cuestiones legales que tienen que ver con el Art. 213 del COOTAD. No se ha podido obtener toda la información de pagos de estas obras por lo que el avance financiero tiene que ser revisado, por lo tanto se tiene un avance de alrededor del 17%		
