




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo		
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021		
Programa del POA	Agua y Saneamiento		
Descripción y objetivo del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..	Objetivo:	
		Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual	

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático								
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución					
				Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	1	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	90,00	Porcentaje	100	80	x	31/03/2021
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10	1	x	31/03/2021
Avance financiero		Codificado							
		Inicial	Reforma		Ejecutado				
GAD MPM		\$	177.274,49	122.970,80	\$ -				

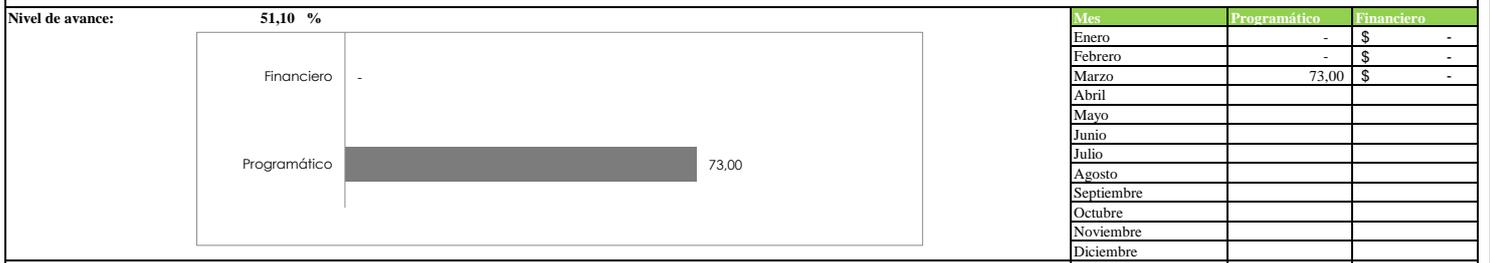

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Marzo, 2021:	Avances: Hasta el momento se cuenta con la Planilla N°6 con un avance de 80% Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/03/2021
